

LAPORAN REFLEKSI: TRELLO VS MICROSOFT PROJECT

Nama Mahasiswa : Edisyah Putra Waruwu
NIM / Prodi : 411231179 / Informatika
Proyek / Sistem : FND Production (Event Lighting Management System)

1. Latar Belakang Transisi Digital

FND Production sebelumnya mengelola perencanaan proyek secara manual atau semi-digital (berkas PDF statis). Transisi rencana proyek ke dalam alat manajemen digital (Trello untuk Kanban dan Microsoft Project untuk Timeline) bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi tim secara dinamis, mengelola dependensi tugas secara ketat, dan memantau beban kerja sumber daya manusia secara real-time.

2. Trello (Kanban Board) – Kelebihan & Limitasi

- **Kelebihan:** Trello sangat unggul dalam visualisasi alur kerja harian (WIP - Work in Progress) menggunakan kartu. Pembagian PIC (PM, BE, FE, UI, QA) tercermin sangat jelas di setiap kartu tugas, lengkap dengan label prioritas dan checklist. Kolaborasi menjadi sangat mudah bagi pengembang junior.
- **Limitasi:** Trello secara bawaan tidak mendukung visualisasi bagan Gantt dan pelacakan jalur kritis (critical path) yang ketat. Hubungan ketergantungan (dependensi) antar tugas WBS tidak dapat dimodelkan secara terstruktur melainkan hanya melalui catatan manual.

3. Microsoft Project (Gantt Chart) – Kelebihan & Limitasi


- **Kelebihan:** Microsoft Project memberikan penegakan dependensi tugas yang luar biasa ketat. Jalur kritis (critical path) terdefinisi secara presisi (seperti penyelesaian skema API 3.2 sebelum integrasi frontend 4.4 dimulai). Lini masa 12 minggu terpetakan dengan sangat kokoh.
- **Limitasi:** Kompleksitas tinggi untuk kru lapangan FND Production yang memerlukan pembaruan status harian yang cepat. Antarmukanya cenderung kaku dan kurang kolaboratif untuk tim pengembangan yang lincah (agile).

4. Rekomendasi Solusi Hibrida (Hybrid Approach)


Untuk FND Production, pendekatan hibrida adalah solusi optimal: menggunakan Microsoft Project di tingkat manajerial (oleh PM) untuk melacak baseline waktu dan dependensi kritis, dikombinasikan dengan Trello di tingkat operasional (oleh Developer, Designer, dan QA) sebagai papan tugas harian interaktif. Kombinasi ini menjamin presisi perencanaan tanpa mengorbankan kelincahan eksekusi.

TANGKAPAN LAYAR HASIL IMPLEMENTASI DIGITAL

Tangkapan Layar A: Trello Board (Kanban View)

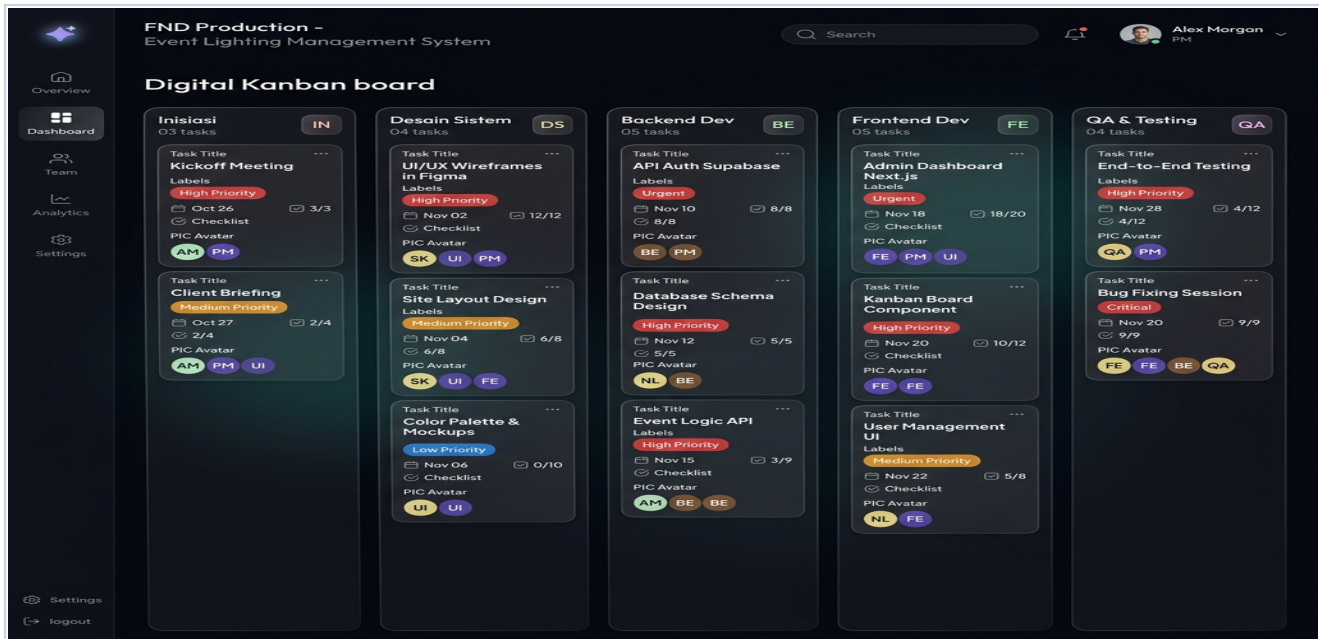

Tangkapan Layar B: Microsoft Project (Timeline / Gantt Chart View)

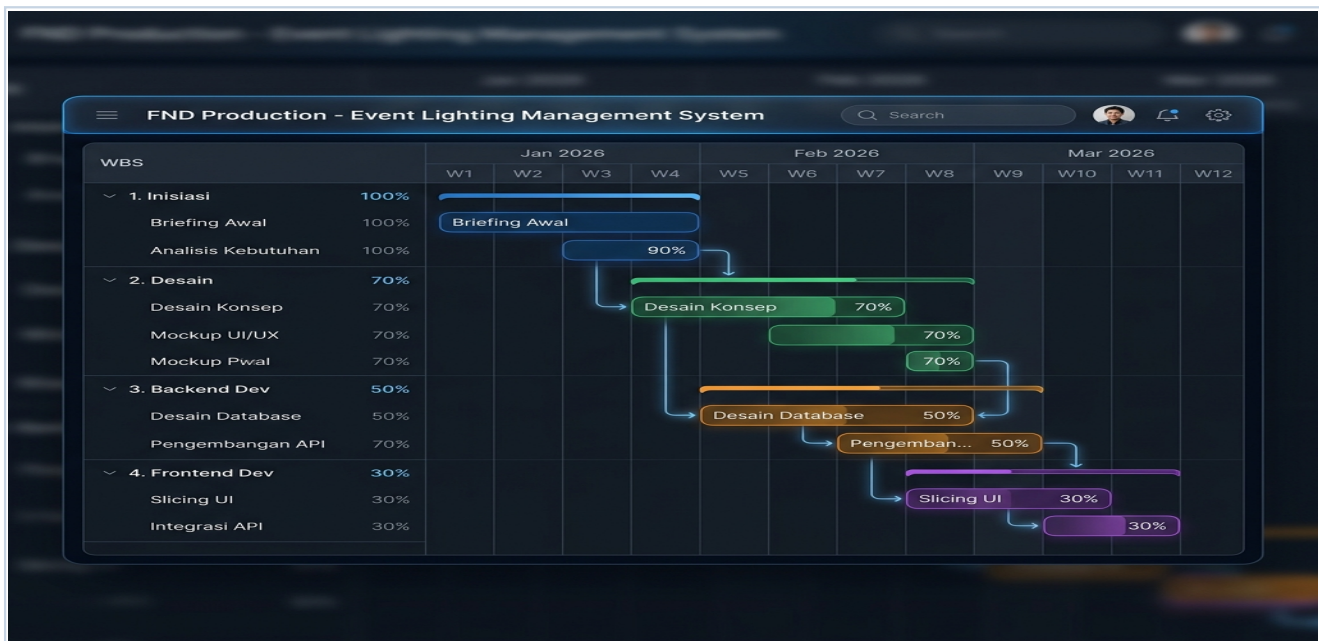

DETAIL TUGAS INTERAKTIF & PELACAKAN DEPENDENSI

Tangkapan Layar C: Detail Tugas Interaktif & Dependensi (Modal View)



Dependensi Kunci WBS dalam Sistem Digital:

- Desain Wireframe Figma (2.2) memiliki dependensi (Predecessor) pada penyelesaian Arsitektur & ERD (2.1).
- Pengembangan Database Schema (3.1) dan REST API (3.2) menunggu approval desain dari Stakeholder (2.3).
- Integrasi Frontend (4.4) bergantung penuh pada ketersediaan REST API Backend (3.2 & 3.3).
- Pengujian Unit & Integration (5.1) dilakukan segera setelah seluruh kode diintegrasikan (4.4).

Disusun Oleh,

Mahasiswa Informatika UNDIRA

Edisyah Putra Waruwu

NIM: 411231179

Divalidasi Oleh,

Dosen Pembimbing Kerja Praktek

(Nama Dosen Pembimbing)

NIDN: _____
